

# 高野町 個別施設計画 橋梁

令和6年3月  
令和6年9月一部改訂  
令和7年9月一部改訂

高野町 建設課

1. 橋梁修繕計画の目的

1) 背景

高野町が管理する橋梁は、令和6年3月15日現在で180橋架設されている。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体の18.3%を占めており、20年後の令和26年には、18.8%程度に増加する。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される。

令和6年度  
33橋  
(18.3%)

↓

令和26年度  
34橋  
(18.8%)

年度	50年以上 (%)	50年未満 (%)
令和6年度 (2014)	18%	82%
令和26年度 (2014)	19%	81%

2) 目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う” 予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

そこで高野町では、将来的な財政負担の低減および道路交通安全の確保を図るために、橋梁修繕計画を策定する。

2. 橋梁修繕計画の対象橋梁

	15m以上	15m未満		合計
全管理橋梁数	20	160		180
うち計画の対象橋梁数	20	160		180
橋梁修繕計画の対象：全管理橋梁				

3. 計画の期間

計画期間は令和6年度から令和15年度の10年間とする。これは、前回期間が平成26年度から令和5年度であり、既に策定している定期点検計画が平成26年度より開始しているためである。
--

#### 4. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

##### 1) 健全度の把握の基本的な方針


定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

##### 2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う。

##### 3) 判定区分の割合

1巡目（H26～H30）の定期点検結果では、健全性Ⅰが39橋、健全性Ⅱが109橋、健全性Ⅲが37橋、健全性Ⅳが0橋であった。定期点検橋梁185橋のうち20%が健全性Ⅲとなっており、早期の措置が必要な状況となっている。必要に応じて対策等の対応を実施することとする。また2巡目（R1～R5）の定期点検では、令和6年3月15日時点で、定期点検橋梁180橋のうち7%が健全性Ⅲとなっている。

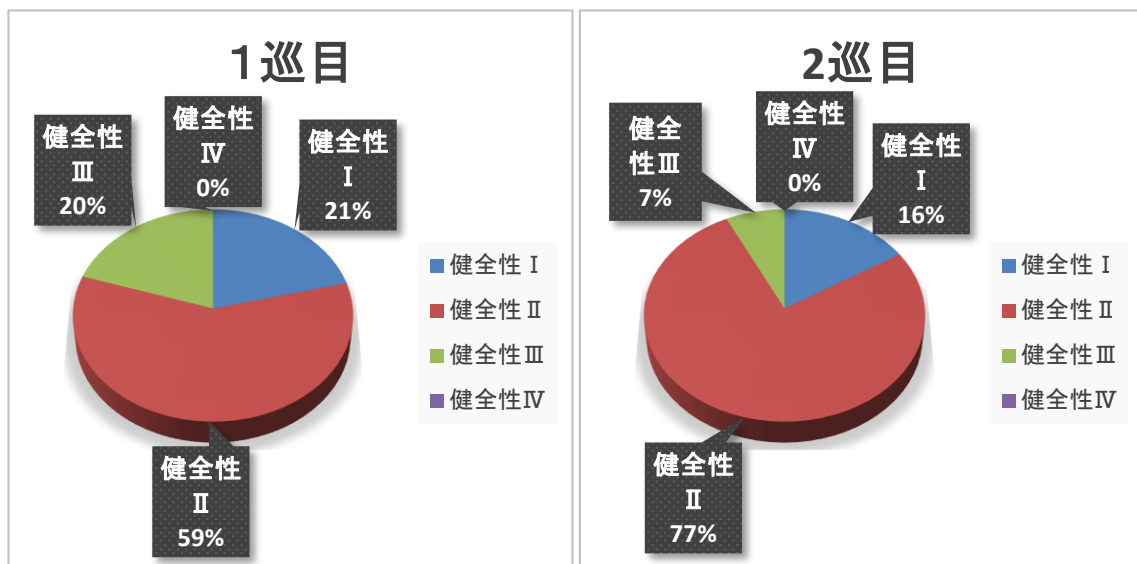

5. 修繕措置の状況

修繕等の措置については、点検の次年度から設計に着手し、次回点検までに修繕等の工事が完了することを目標に対策を行う。

1 巡目

点検年度 (H26～H30)	対策数 (Ⅲ,Ⅳ判定)	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
H26	8	8	100.0%	8	100.0%
H27	3	3	100.0%	2	66.7%
H28	12	12	100.0%	11	91.7%
H29	4	4	100.0%	3	75.0%
H30	10	10	100.0%	10	100.0%
合計	37	37	100.0%	34	86.7%

2 巡目

点検年度 (R1～R5)	対策数 (Ⅲ,Ⅳ判定)	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
R1	1	1	100.0%	1	100.0%
R2	2	2	100.0%	2	100.0%
R3	2	2	100.0%	2	100.0%
R4	1	1	100.0%	1	100.0%
R5	7	0	0.0%	0	0.0%
合計	13	6	100.0%	6	100.0%

6. 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、各橋梁の状態のほか、果たしている役割や機能、利用状況等を踏まえ、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要措置を講じる。

なお、対策の優先順位は橋梁の健全性、第3者への影響度や路線の重要性などを総合的に勘案して判断する。

優先度の考え方は以下による。

○主部材の損傷状況

・主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁を優先

○橋梁の重要度

・重要路線に位置する橋梁を優先

・跨線橋、跨道橋など第3者へ影響のある橋梁を優先

・橋長の長い橋梁を優先

## 7. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

高野町が管理する橋梁の中で、架設後50年以上経過した橋梁は全体の約18.8%を占めているため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100年間とすることを目標とし、修繕及び架替えに要するコストを縮減する。

### 1) 新技術等の活用方針

管理する全ての橋梁について、点検や修繕に際して新技術等の活用を検討するとともに、費用の縮減や事業の効率化が見込まれる新技術等を、今後5年間で5橋程度使用することを目標とする。また、「NETIS登録技術」や「点検支援技術性能カタログ(案)」等に登録されている新技術・新工法・新材料の活用実施による費用縮減は、5%程度を目標とする。

### 2) 費用の縮減に関する方針

損傷が顕著化した後に補修を行う従来の事後保全型の維持管理から、顕著化する前に計画的に補修を行う予防保全型の維持管理に移行し、ライフサイクルコストの縮減や修繕時期の平準化を図る。

また、点検結果および周辺道路の整備状況や利用状況等を踏まえ、必要に応じ、集約化・撤去、機能縮小等による費用縮減を検討する。具体的な数値目標として、1橋程度の橋梁について集約化・撤去に取り組み、点検等の維持管理費用約30万円縮減することを目標とする。

## 8. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

別表による



表示	施設名	施設名_フリガナ	路線名	道路管理者	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	種類	点検記録 実施年度	判定 区分	点検計画	修繕	修繕計画	修繕計画 内容	既修繕施設 概算 修繕金額 (百万円)	設計概算 修繕金額 (百万円)
1	出合橋	(デ`アイバ`シ)	町道細川花坂線	高野町	1962	17.0	3.5	桁橋(T桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		17
2	深山橋	(ミヤマバ`シ)	町道作水1号線	高野町	1977	32.8	4.0	桁橋(I桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		29
3	高野幹線18号橋	(コウヤカンセン18コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	1967	15.0	4.0	桁橋(T桁)	2021	Ⅱ	2026	済			2.2	
4	高野幹線14号橋	(コウヤカンセン14コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	1958	15.6	3.6	桁橋(T桁)	2021	Ⅱ	2026	済			2.6	
5	新極楽橋	(シンコ`クラカバ`シ)	町道高野幹線	高野町	1956	15.0	5.7	桁橋(T桁)	2021	Ⅱ	2026	済			23.9	
6	高野幹線8号橋	(コウヤカンセン8コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	1956	52.5	4.6	桁橋(T桁)	2019	Ⅲ	2024	済		修繕	126	
7	前川橋	(マエカワバ`シ)	町道相ノ浦1号線	高野町	1979	31.1	2.5	床版橋	2020	Ⅱ	2025					
8	ふない橋	(フナイバ`シ)	町道桑原1号線	高野町	2004	19.0	5.0	床版橋	2021	Ⅱ	2026	済			0.5	
9	大門高野山駅線1号橋	(ダ`イモンコウヤサンエキセン1コ`ウバ`シ)	町道大門高野山駅線	高野町	1979	22.8	17.4	桁橋(I桁)	2020	Ⅱ	2025					
10	大門高野山駅線2号橋	(ダ`イモンコウヤサンエキセン2コ`ウバ`シ)	町道大門高野山駅線	高野町	1979	69.9	8.8	桁橋(I桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		20
11	大滝1号線3号橋	(オホタキ1コ`ウセン3コ`ウバ`シ)	町道大滝1号線	高野町	不明	31.0	2.0	桁橋(I桁)	2021	Ⅱ	2026		2025以降	修繕		17.8
12	中尾線1号橋	(ナカオセン1コ`ウバ`シ)	町道中尾線	高野町	不明	21.4	2.5	桁橋(H桁)	2020	Ⅱ	2025	着手	2022	修繕		12
13	中筒香3号線1号橋	(ナカツツカ`3コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道中筒香3号線	高野町	不明	19.5	3.0	桁橋(H桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		13
14	堂前線1号橋	(ト`ウマエセン1コ`ウバ`シ)	町道堂前線	高野町	不明	14.7	2.5	桁橋(H桁)	2020	Ⅱ	2025					
15	傳治橋	(デ`ンヂバ`シ)	町道城谷線	高野町	1967	33.9	3.0	桁橋(I桁)	2021	Ⅱ	2026	済			11.6	
16	相ノ浦2号線1号橋	(アイノウラ2コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道相ノ浦2号線	高野町	1973	25.4	2.5	桁橋(H桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		11
17	花坂4号線2号橋	(ハナサカ4コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道花坂4号線	高野町	不明	14.5	2.5	桁橋(I桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		1
18	宮村橋	(ミヤムラバ`シ)	町道宮村線	高野町	不明	22.3	4.0	桁橋(I桁)	2020	Ⅱ	2025	済			17.9	
19	宮村線1号橋	(ミヤムラセン1コ`ウバ`シ)	町道宮村線	高野町	不明	15.4	4.0	桁橋(H桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		1.5
20	大滝橋	(オホタバ`シ)	町道御殿川線	高野町	不明	15.4	4.0	桁橋(H桁)	2021	Ⅱ	2026	済			14.1	
21	桑原1号線1号橋	(クラバ`ラ1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道新生2号線	高野町	不明	4.8	3.1	床版橋	2020	Ⅱ	2025					
22	光の滝老号橋	(コウノタキイコ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	1989	12.6	9.5	床版橋	2019	Ⅱ	2024		2025以降	修繕		8
23	高野幹線2号橋	(コウヤカンセン2コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	8.0	5.1	桁橋(T桁)	2019	I	2024	済			8	
24	高野幹線3号橋	(コウヤカンセン3コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	6.4	5.6	桁橋(T桁)	2019	Ⅱ	2024					
25	高野幹線4号橋	(コウヤカンセン4コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	7.0	5.1	桁橋(T桁)	2019	I	2024	済			7.6	
26	高野幹線5号橋	(コウヤカンセン5コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	4.8	5.4	床版橋	2019	I	2024	済			13.4	
27	高野幹線6号橋	(コウヤカンセン6コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	5.0	4.0	床版橋	2019	Ⅱ	2024	済			2.6	
28	高野幹線7号橋	(コウヤカンセン7コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	6.6	4.0	桁橋(T桁)	2019	I	2024	済			2.7	
29	高野幹線9号橋	(コウヤカンセン9コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	4.3	4.2	床版橋	2019	Ⅱ	2024	済			11.5	
30	高野幹線10号橋	(コウヤカンセン10コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	2.8	4.0	床版橋	2019	Ⅱ	2024					
31	高野幹線11号橋	(コウヤカンセン11コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	2.4	3.7	床版橋	2019	I	2024					
32	高野幹線12号橋	(コウヤカンセン12コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	4.5	4.0	床版橋	2019	Ⅱ	2024					
33	高野幹線13号橋	(コウヤカンセン13コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	3.1	3.5	床版橋	2019	Ⅱ	2024					
34	高野幹線15号橋	(コウヤカンセン15コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	2.2	3.6	床版橋	2019	I	2024					
35	高野幹線16号橋	(コウヤカンセン16コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	5.0	4.2	桁橋(T桁)	2019	Ⅱ	2024					
36	高野幹線17号橋	(コウヤカンセン17コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	3.0	3.5	床版橋	2019	Ⅱ	2024					
37	高野幹線19号橋	(コウヤカンセン19コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	2.8	3.5	床版橋	2019	Ⅱ	2024					
38	高野幹線20号橋	(コウヤカンセン20コ`ウバ`シ)	町道高野幹線	高野町	不明	2.2	6.0	床版橋	2019	I	2024	済			6.6	
39	作水1号線1号橋	(サミズ`1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道作水1号線	高野町	不明	5.2	4.0	床版橋	2020	I	2025					
40	文化通り1号線1号橋	(ブンカ`ドオリ1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道文化通り1号線	高野町	不明	9.0	2.5	床版橋	2020	I	2025					
41	細川線1号橋	(ホカワセン1コ`ウバ`シ)	町道細川線	高野町	不明	6.6	3.0		2021	Ⅱ	2026					
42	細川線2号橋	(ホカワセン2コ`ウバ`シ)	町道細川線	高野町	不明	6.6	3.0		2021	I	2026					
43	細川線3号橋	(ホカワセン3コ`ウバ`シ)	町道細川線	高野町	不明	8.0	3.0		2021	I	2026					
44	細川線4号橋	(ホカワセン4コ`ウバ`シ)	町道細川線	高野町	不明	8.1	3.0		2021	I	2026					
45	細川線6号橋	(ホカワセン6コ`ウバ`シ)	町道細川線	高野町	不明	2.6	4.7		2021	Ⅱ	2026					
46	不動野線1号橋	(フト`ウバセン1コ`ウバ`シ)	町道不動野線	高野町	不明	8.0	6.3		2021	Ⅱ	2026					
47	西平橋	(ニシヒラバ`シ)	町道花坂1号線	高野町	1962	11.6	3.7	桁橋(T桁)	2020	Ⅱ	2025		2025以降	修繕		11
48	上湯川線1号橋	(カミユカワセン1コ`ウバ`シ)	町道上湯川線	高野町	1955	11.8	3.5		2023	Ⅱ	2028					
49	上湯川線2号橋	(カミユカワセン2コ`ウバ`シ)	町道上湯川線	高野町	不明	11.5	3.0	桁橋(H桁)	2021	Ⅱ	2026	済			6.6	
50	上湯川線3号橋	(カミユカワセン3コ`ウバ`シ)	町道上湯川線	高野町	不明	8.4	3.5		2021	Ⅱ	2026					
51	筒香峠1号線1号橋	(ツツカ`トリゲ`1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道筒香峠1号線	高野町	不明	3.0	2.0		2021	Ⅱ	2026					
52	筒香峠1号線2号橋	(ツツカ`トリゲ`1コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道筒香峠1号線	高野町	不明	2.6	0.9		2023	Ⅱ	2028					
53	高根1号線1号橋	(タカネ1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道高根1号線	高野町	不明	4.4	4.0		2021	Ⅱ	2026					
54	樫原1号線1号橋	(カシハラ1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道樫原1号線	高野町	不明	4.5	3.6		2021	Ⅱ	2026					
55	樫原1号線2号橋	(カシハラ1コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道樫原1号線	高野町	不明	9.6	3.5		2021	Ⅱ	2026					
56	樫原1号線3号橋	(カシハラ1コ`ウセン3コ`ウバ`シ)	町道樫原1号線	高野町	不明	4.5	5.2		2021	Ⅱ	2026					
57	樫原1号線4号橋	(カシハラ1コ`ウセン4コ`ウバ`シ)	町道樫原1号線	高野町	不明	6.0	4.0		2021	Ⅱ	2026					
58	杖ヶ藪1号線1号橋	(ツエガ`ヤブ`1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道杖ヶ藪1号線	高野町	不明	6.2	5.2		2021	Ⅱ	2026					
59	杖ヶ藪1号線2号橋	(ツエガ`ヤブ`1コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道杖ヶ藪1号線	高野町	不明	12.6	2.0		2021	Ⅱ	2026					
60	大日川線1号橋	(オホ`ヒカワセン1コ`ウバ`シ)	町道大日川線	高野町	不明	4.8	3.2		2021	Ⅱ	2026					
61	大日川線2号橋	(オホ`ヒカワセン2コ`ウバ`シ)	町道大日川線	高野町	不明	2.7	3.0		2021	I	2026					
62	がいらこ橋	(ガ`イラクバ`シ)	町道西ヶ峯線	高野町	不明	7.0	3.5		2021	Ⅱ	2026					
63	西ヶ峯線2号橋	(ニシカ`ミセノ2コ`ウバ`シ)	町道西ヶ峯線	高野町	不明	8.0	3.0		2021	Ⅱ	2026					
64	東小田原線1号橋	(ヒガ`シオダワラセン1コ`ウバ`シ)	町道東小田原線	高野町	不明	3.9	2.4		2021	Ⅱ	2026					
65	奥ノ院線1号橋	(オクノインセン1コ`ウバ`シ)	町道奥ノ院線	高野町	不明	7.5	8.7		2021	Ⅱ	2026					
66	奥ノ院線2号橋	(オクノインセン2コ`ウバ`シ)	町道奥ノ院線	高野町	不明	5.0	7.2		2021	Ⅱ	2026					
67	西郷2号線1号橋	(ニシコ`ウ2コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道西郷2号線	高野町	不明	2.2	1.1	床版橋	2023	I	2028	済			0.1	
68	西郷2号線2号橋	(ニシコ`ウ2コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道西郷2号線	高野町	不明	4.7	0.7		2023	Ⅲ	2028		2025以降	修繕		
69	西郷2号線3号橋	(ニシコ`ウ2コ`ウセン3コ`ウバ`シ)	町道西郷2号線	高野町	不明	4.4	0.8		2023	Ⅱ	2028					
70	西郷八幡神社1号線1号橋	(ニシコ`ウチマツジ`ンシ`ヤ1コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道西郷八幡神社1号線	高野町	不明	7.6	1.2		2021	Ⅱ	2026					
71	西郷八幡神社1号線3号橋	(ニシコ`ウチマツジ`ンシ`ヤ1コ`ウセン3コ`ウバ`シ)	町道西郷八幡神社1号線	高野町	不明	4.5	0.5		2023	Ⅲ	2028		2025以降	修繕		
72	西郷八幡神社1号線4号橋	(ニシコ`ウチマツジ`ンシ`ヤ1コ`ウセン4コ`ウバ`シ)	町道西郷八幡神社1号線	高野町	不明	6.5	1.3		2021	Ⅱ	2026					
73	西郷八幡神社1号線5号橋	(ニシコ`ウチマツジ`ンシ`ヤ1コ`ウセン5コ`ウバ`シ)	町道西郷八幡神社1号線	高野町	不明	2.3	0.5	床版橋	2023	Ⅲ	2028	済		修繕	0.1	
74	西郷八幡神社1号線6号橋	(ニシコ`ウチマツジ`ンシ`ヤ1コ`ウセン6コ`ウバ`シ)	町道西郷八幡神社1号線	高野町	不明	5.5	1.3	床版橋	2023	I	2028	済			0.2	
75	西郷八幡神社1号線7号橋	(ニシコ`ウチマツジ`ンシ`ヤ1コ`ウセン7コ`ウバ`シ)	町道西郷八幡神社1号線	高野町	不明	3.0	0.5		2023	Ⅱ	2028					
76	弁天橋	(ハ`ンテンバ`シ)	町道東細川12号線	高野町	不明	11.6	2.7		2022	Ⅱ	2027					
77	東細川2号線1号橋	(ヒガ`シホリカワ2コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道東細川2号線	高野町	不明	4.4	2.0		2022	Ⅱ	2027					
78	東細川2号線2号橋	(ヒガ`シホリカワ2コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道東細川2号線	高野町	不明	3.8	2.0		2022	Ⅱ	2027					
79	東細川4号線1号橋	(ヒガ`シホリカワ4コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道東細川4号線	高野町	不明	12.5	2.0		2022	Ⅱ	2027					
80	東細川4号線2号橋	(ヒガ`シホリカワ4コ`ウセン2コ`ウバ`シ)	町道東細川4号線	高野町	不明	5.0	1.9		2023	Ⅲ	2028	済	2025以降	修繕	0.1	
81	森脇線1号橋	(モリワキセン1コ`ウバ`シ)	町道森脇線	高野町	不明	7.4	4.0		2022	I	2027					
82	西細川小学校線1号橋	(ニシホリカワリョウガ`コウガセン1コ`ウバ`シ)	町道西細川小学校線	高野町	不明	7.5	2.9		2022	I	2027	済			10.6	
83	西細川小学校線2号橋	(ニシホリカワリョウガ`コウガセン2コ`ウバ`シ)	町道西細川小学校線	高野町	不明	8.3	2.7		2022	Ⅱ	2027					
84	社前橋	(シャ`ゼンバ`シ)	町道細川八坂神社線	高野町	1967	10.7	3.1	桁橋(T桁)	2021	Ⅱ	2026	済			1.1	
85	細川八坂神社1号橋	(ホリカワサカシ`ンシ`ヤ1コ`ウバ`シ)	町道細川八坂神社線	高野町	1967	12.4	2.2	桁橋(H桁)	2021	Ⅱ	2026	済			8.8	
86	花坂3号線1号橋	(ハナサカ3コ`ウセン1コ`ウバ`シ)	町道花坂3号線	高野町	不明	10.0	2.0		2022	Ⅱ	2027					



表示	施設名	施設名_フリガナ	路線名	道路管理者	架設年度	橋長	幅員	種類	点検記録 実施年度	判定 区分	点検計画	修繕	修繕計画	修繕計画 内容	既修繕施設 概算 修繕金額 (百万円)	設計概算 修繕金額 (百万円)
						(m)	(m)									
101	南線2号橋	(ミナミン2ゴウハシ)	町道南線	高野町	不明	5.0	2.5		2022	Ⅱ	2027					
102	南線3号橋	(ミナミン3ゴウハシ)	町道南線	高野町	不明	5.0	2.5		2022	Ⅱ	2027					
103	林2号線1号橋	(ハヤシ2ゴウケン1ゴウハシ)	町道林2号線	高野町	不明	3.8	1.3		2023	Ⅱ	2028					
104	東又線1号橋	(ヒガシマタセン1ゴウハシ)	町道東又線	高野町	不明	6.4	4.2		2022	Ⅱ	2027					
105	杖ヶ藪2号線1号橋	(ツエカギヤブ2ゴウケン1ゴウハシ)	町道杖が藪2号線	高野町	不明	8.3	4.0		2022	Ⅱ	2027					
106	上中居線1号橋	(ウエカカイセン1ゴウハシ)	町道上中居線	高野町	不明	2.4	5.1		2022	I	2027					
107	成金線1号橋	(ナリキンセン1ゴウハシ)	町道成金線	高野町	不明	5.3	4.4		2022	Ⅱ	2027					
108	成金線2号橋	(ナリキンセン2ゴウハシ)	町道成金線	高野町	不明	6.9	4.5		2022	I	2027					
109	成金線3号橋	(ナリキンセン3ゴウハシ)	町道成金線	高野町	不明	6.9	4.2		2022	Ⅱ	2027					
110	桑原大石線1号橋	(クワハラオオイセン1ゴウハシ)	町道桑原大石線	高野町	不明	5.8	1.5	床版橋	2023	Ⅱ	2028	済			0.2	
111	桑原2号線1号橋	(クワハラ2ゴウケン1ゴウハシ)	町道桑原2号線	高野町	不明	2.5	3.0		2022	Ⅱ	2027					
112	桑原2号線2号橋	(クワハラ2ゴウケン2ゴウハシ)	町道桑原2号線	高野町	不明	4.5	2.7		2022	Ⅱ	2027					
113	筒香峠2号線1号橋	(ツツカトウケ2ゴウケン1ゴウハシ)	町道筒香峠2号線	高野町	不明	6.1	2.5		2022	Ⅱ	2027					
114	西富貴1号線1号橋	(ニシフウキ1ゴウケン1ゴウハシ)	町道西富貴1号線	高野町	不明	5.3	1.8		2022	Ⅲ	2027	済		修繕		2.3
115	上手線1号橋	(カミデセン1ゴウハシ)	町道上手線	高野町	不明	5.7	2.1		2022	Ⅱ	2027					
116	上手線2号橋	(カミデセン2ゴウハシ)	町道上手線	高野町	不明	3.2	5.2		2022	Ⅱ	2027					
117	上手線3号橋	(カミデセン3ゴウハシ)	町道上手線	高野町	不明	5.0	1.2		2023	Ⅱ	2028	済			0.1	
118	地獄谷線1号橋	(ジゴクガニセン1ゴウハシ)	町道地獄谷線	高野町	不明	5.3	3.1		2022	I	2027	済			2.9	
119	地獄谷線2号橋	(ジゴクガニセン2ゴウハシ)	町道地獄谷線	高野町	不明	6.0	2.6		2022	Ⅱ	2027					
120	地獄谷線3号橋	(ジゴクガニセン3ゴウハシ)	町道地獄谷線	高野町	不明	3.5	2.6		2022	I	2027					
121	毛抜谷橋	(ケヌキダニハシ)	町道地獄谷線	高野町	不明	6.5	2.5		2022	Ⅱ	2027					
122	地獄谷橋	(ジゴクガニハシ)	町道地獄谷線	高野町	不明	6.2	2.6		2022	Ⅱ	2027					
123	地獄谷線4号橋	(ジゴクガニセン4ゴウハシ)	町道地獄谷線	高野町	不明	2.0	3.4		2022	Ⅱ	2027					
124	塙手3号線1号橋	(ハナテ3ゴウケン1ゴウハシ)	町道塙手3号線	高野町	不明	3.7	1.9		2023	I	2028					
125	北畑線1号橋	(キタハタセン1ゴウハシ)	町道北畑線	高野町	不明	4.0	2.7		2022	I	2027					
126	北畑線2号橋	(キタハタセン2ゴウハシ)	町道北畑線	高野町	不明	5.7	0.9		2023	Ⅲ	2028		2025以降	修繕		
127	中筒香2号線1号橋	(ナカツツカ2ゴウケン1ゴウハシ)	町道中筒香2号線	高野町	不明	14.2	2.0		2022	Ⅱ	2027					
128	筒香峠4号線1号橋	(ツツカトウケ4ゴウケン1ゴウハシ)	町道筒香峠4号線	高野町	不明	6.0	1.5		2023	I	2028	済			0.2	
129	町道町石道線1号橋	(チョウドウチヨウイミセン1ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	6.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
130	町道町石道線2号橋	(チョウドウチヨウイミセン2ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	6.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
131	町道町石道線3号橋	(チョウドウチヨウイミセン3ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	6.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
132	町道町石道線4号橋	(チョウドウチヨウイミセン4ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	12.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
133	町道町石道線5号橋	(チョウドウチヨウイミセン5ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	6.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
134	東細川3号線1号橋	(ヒガシホカワ3ゴウケン1ゴウハシ)	町道東細川3号線	高野町	不明	9.4	3.0		2022	Ⅱ	2027					
135	東細川3号線2号橋	(ヒガシホカワ3ゴウケン2ゴウハシ)	町道東細川3号線	高野町	不明	4.7	3.0		2022	I	2027					
136	中谷線1号橋	(ナカタニセン1ゴウハシ)	町道中谷線	高野町	不明	5.1	3.0		2022	Ⅱ	2027					
137	中谷線2号橋	(ナカタニセン2ゴウハシ)	町道中谷線	高野町	不明	3.2	4.0		2022	Ⅱ	2027					
138	大門玉川線1号橋	(タモモンタマカワセン1ゴウハシ)	町道大門玉川線	高野町	不明	10.4	3.5		2022	Ⅱ	2027		2025以降	修繕		1
139	桑原1号線1号橋	(クワハラ1ゴウケン1ゴウハシ)	町道桑原1号線	高野町	不明	2.8	14.1		2022	Ⅱ	2027					
140	町道町石道線9号橋	(チョウドウチヨウイミセン9ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	8.0	1.5		2022	Ⅱ	2027	済			0.4	
141	町道町石道線7号橋	(チョウドウチヨウイミセン7ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	6.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
142	町道町石道線8号橋	(チョウドウチヨウイミセン8ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	6.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
143	町道町石道線6号橋	(チョウドウチヨウイミセン6ゴウハシ)	町道町道町石道線	高野町	不明	8.0	1.5		2022	Ⅱ	2027					
144	細川花坂1号橋	(ホカワハナサカ1ゴウハシ)	町道細川花坂線	高野町	不明	2.9	3.2		2022	Ⅱ	2027					
145	細川花坂2号橋	(ホカワハナサカ2ゴウハシ)	町道細川花坂線	高野町	不明	7.4	3.0		2022	Ⅱ	2027					
146	地蔵橋	(ジゾウハシ)	町道梨子ノ木線	高野町	不明	9.6	5.4		2022	I	2027					
147	熊谷橋	(クマダニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1966	18.0	5.7		2021	Ⅱ	2026					
148	曲谷橋	(マクリタニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1963	20.0	5.2		2021	Ⅱ	2026	済			2.1	
149	相谷橋	(アイタニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1961	8.1	6.8		2021	Ⅲ	2026	済		修繕	12	
150	無名橋（薄峠橋）	(ムメイヨシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	3.0	4.3	床版橋	2020	Ⅱ	2025					
151	平谷橋	(ヒラダニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1961	14.2	5.2		2021	Ⅱ	2026	済			3.8	
152	第三号橋	(サードゴウキヨウ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1962	12.0	5.7		2021	Ⅱ	2026					
153	水源地橋	(スイゲンチハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1965	12.8	5.7		2021	Ⅱ	2026					
154	五号橋	(ゴウキヨウ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1963	10.5	7.2		2021	Ⅱ	2026					
155	六号橋	(ロウキヨウ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1962	13.2	5.3		2021	Ⅱ	2026					
156	鶏渕橋	(トリフチハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1960	9.4	4.9		2021	Ⅱ	2026					
157	堺橋	(サカイハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1957	14.0	4.8		2021	Ⅱ	2026					
158	山谷橋	(ヤマタニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1959	8.0	6.9		2021	Ⅲ	2026	済		修繕		32
159	山谷南橋	(ヤマタニミナハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	5.6	7.5		2021	Ⅱ	2026					
160	笠峠北橋	(カサトウケキタハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	5.0	5.2		2021	Ⅱ	2026					
161	笠峠橋	(カサトウケハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1965	5.3	6.0		2021	Ⅱ	2026					
162	深田和橋	(フカダワハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1957	14.0	4.9		2021	Ⅱ	2026					
163	水呑谷橋	(ミズノミタニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1963	7.5	5.7		2021	Ⅱ	2026					
164	新水呑橋	(シンミズノミハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1958	9.5	5.9		2021	Ⅱ	2026					
165	一之枝橋	(イチエダハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1959	14.0	7.6		2021	Ⅱ	2026					
166	熊谷北橋	(クマタニキタハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	6.5	5.4		2021	Ⅱ	2026					
167	上垣内橋	(カミガイトハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	5.1	4.2		2021	Ⅱ	2026					
168	宮前橋	(ミヤマエハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1963	5.3	5.3		2021	Ⅱ	2026					
169	下垣内橋	(シモガイトハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	5.0	5.2		2021	Ⅱ	2026					
170	御殿橋	(ゴテンハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	5.0	6.0		2021	Ⅱ	2026					
171	浦森橋	(ウラモリハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	1960	14.1	7.2		2021	Ⅱ	2026					
172	うずら谷橋	(ウスラダニハシ)	町道高野相ノ浦線	高野町	不明	9.5	5.7		2021	Ⅱ	2026					
173	桑原大石線2号橋	(クワハラオオイセン2ゴウハシ)	町道桑原大石線	高野町	不明	6.2	1.5	床版橋	2023	Ⅲ	2028	済	2025以降	修繕	0.2	
174	森倉線1号橋	(モリクラセン1ゴウハシ)	町道森倉線	高野町	不明	2.4	3.4		2023	I	2028					
175	杖ヶ藪1号線3号橋	(ツエカギヤブ1ゴウケン3ゴウハシ)	町道杖ヶ藪1号線	高野町	不明	4.6	4.9		2023	Ⅲ	2028		2025以降	修繕		
176	きえ谷橋	(キエタニハシ)	三ノ谷線	高野町	不明	6.8	6.9		2023	Ⅱ	2028	済				
177	上筒香橋	(カミツツカハシ)	三ノ谷線	高野町	1963	6.0	5.0		2023	Ⅱ	2028					
178	善寺橋	(チンデラハシ)	三ノ谷線	高野町	1964	5.0	5.0		2023	Ⅱ	2028					
179	曲尾橋	(マクリオハシ)	三ノ谷線	高野町	1968	4.2	5.7		2023	Ⅱ	2028					
180	舟迫橋	(フナオイハシ)	三ノ谷線	高野町	1964	6.4	5.1		2023	I	2028					
181	御殿川東2号橋	(オドカワヒガシ2ゴウハシ)	町道大門玉川線	高野町	不明	5.4	208.0		2025		2025以降					
